

Fakten

Name	Samakkeexai Lower Secondary School
Art der Einrichtung	Schulgebäude
Anzahl Schüler/Innen	137 (58 m., 79 w.)
Anzahl Lehrer/Innen	10 (7 m., 3 w.)
Anzahl von uns gebauter Schulzimmer	1 Schulgebäude mit 6 möblierten Schulzimmern & 4 Toiletten
Gebäudegrundfläche	336 m ²
Totalkosten	USD 56,175.60
Ausführungszeitraum	Nov 2016 – Feb 2017
Projektleiter	Herr Somsak Kamdang
Lage (Provinz)	Pak Khaen Dorf, Ngern Distrikt, Xiagnabouli Provinz, Nordlaos

Kurzübersicht

Die 2015 gegründete Samakkeexai Lower Secondary School liegt in der Xaignabouli Provinz in Nordlaos am Mekong Fluss. Aufgrund der limitierten Ressourcen und der überfüllten Schulzimmer wurden die Schüler in einem vorübergehenden und heruntergekommenen Schulgebäude bestehend aus gewobenen Bambuswänden und einem Grasdach unterrichtet. Das Schulgebäude war weder wetterbeständig noch sicher und stellte eine denkbar ungeeignete Lernumgebung dar.

Im kommenden Jahr wird eine Studentenzuwachsrate von 40 – 50% erwartet, womit sich das Problem der stark überfüllten Schulzimmer weiter zuspitzen wird. Um die Situation der überfüllten und verrottenden Schulzimmer zu verbessern, haben wir ein neues, grösseres Schulgebäude mit 6 vollständig ausgestatteten Schulzimmern sowie 4 zusätzlichen Toiletten gebaut. Durch diese Massnahmen haben wir die Lernumgebung sowie die hygienischen Bedingungen für die Schüler und Lehrer markant verbessert.

Wie bei allen unserer Projekte haben wir auch hier die Gemeinde stark in den Bau einbezogen. Diese Projekteinbindung ist wichtig, da es die Gemeinde bestärkt, mit Stolz die Verantwortung für das Gebäude zu übernehmen. Die Gemeinde ist für das Instandhalten der Infrastruktur zuständig und beteiligte sich mit manuellen Arbeiten und stellte Holz und Erde bereit. Der Schulleiter sorgte dafür, dass das Grundstück für das Gebäude vorbereitet war. Für den Lehrplan und –material sowie die Lehrerausbildung und –löhne ist die laotische Regierung zuständig. Der unter Vertrag genommene Bauunternehmer war für jegliche Materialbeschaffung, Erstellung, Transport sowie die Innenausstattung zuständig. Die Bezahlung erfolgte entsprechend dem Baufortschritt in vier Raten, wobei fünf Prozent der Gesamtkosten als Qualitätsgarantie für ein Jahr zurückbehalten wurde. Die Bauarbeiten verliefen sehr gut, sodass wir sogar frühzeitig mit dem Bau fertig wurden. Wir haben das Bauprojekt eng begleitet und werden auch im Nachhinein Folgebesuche abstatten um die Nachhaltigkeit sicherstellen zu können.

Einweihung

Die Eröffnungsfeier fand am 10. März 2017 statt. Wir haben es sehr geschätzt und uns darüber gefreut, dass die SLS mit einer Gruppe von Mitgliedern an dieser wichtigen Zeremonie beteiligt war.

Chiang Mai, 16. März 2017

Karte



Projektleiter

Somsak Kamdang
Kurzname: Sak

Sak arbeitet seit Januar 2015 für Child's Dream als Assistant Field Coordinator für Laos

sak@childsdream.org

Mobile: +66 (0)918 562 077



Child's Dream Foundation



Marc T. Jenni
Gründer & Head Operations



Daniel M. Siegfried
Gründer & Head Projects

Fotos



Willkommen an der Samakkeexai Sekundarschule



Die Primarschüler teilten sich das Betongebäude (links im Bild) mit den Sekundarschülern



Einige Primarschüler mussten auf dieses Gebäude mit Wänden aus gewobenem Bambus und Strohdach ausweichen



Die Schulzimmer sind hoffnungslos überfüllt und in den nächsten Jahren wird ein Anstieg der Schüleranzahl erwartet



Vertragsunterzeichnung mit dem Bauunternehmer und den Gemeindeverantwortlichen



Das Land wurde vom Schulleiter für das neue Schulgebäude vorbereitet



Das Fundament ist gelegt



Wir sind mit dem problemlosen Ablauf sehr zufrieden



Das neue, grössere Schulgebäude mit sechs möblierten Schulzimmern und vier Toiletten ist in den letzten Zügen der Fertigstellung



Das Schulgebäude ist bezugsbereit. Vier neue Toiletten bedeuten eine deutliche Verbesserung der Hygienebedingungen



Einweihungsfest mit Zeremonie



Symbolische Schlüsselübergabe



Die Schüler freuten sich über die roten Mützen der SLS sehr



Es wurden Gartenbeete angelegt



Vom restlichen Baumaterial hat die Gemeinde einen Unterstand gebaut



Lehrer und Schüler sind gespannt auf die neue Schule



Darbietungen der Schüler als Dankeschön an die SLS



Zusammen sind wir stark und können viel bewirken



Herzlichen Dank für Eure grosszügige Unterstützung!




Financial Report

Samakkeexai Lower Secondary School Building

Budget Fx 7,880.00 Expenses Fx 7,880.00

Financial overview		In budget currency (LAK)			In reporting currency (USD)		
Account item	Account sub-item	Budget	Actual cost	Deviation	Budget	Actual cost	Deviation
Infrastructure	Construction materials	256,175,000.00	261,263,394.51	-5,088,394.51	32,509.52	33,155.25	-645.74
Infrastructure	Interior Equipment / Furniture	33,750,000.00	47,231,036.65	-13,481,036.65	4,282.99	5,993.79	-1,710.79
Infrastructure	Labour costs	92,000,000.00	87,400,000.00	4,600,000.00	11,675.13	11,091.37	583.76
Infrastructure	Transportation & Rental	11,960,000.00	0.00	11,960,000.00	1,517.77	0.00	1,517.77
	Project subtotal	393,885,000.00	395,894,431.17	-2,009,431.17	49,985.41	50,240.41	-255.00
	Monitoring costs (DPA)	16,411,875.00	15,886,757.25	525,117.75	2,082.73	2,016.09	66.64
	Admin overhead	30,882,560.48	30,882,560.48	0.00	3,919.11	3,919.11	0.00
	TOTAL	441,179,435.48	442,663,748.90	-1,484,313.41	55,987.24	56,175.60	-188.36

Actual Cost Breakdown

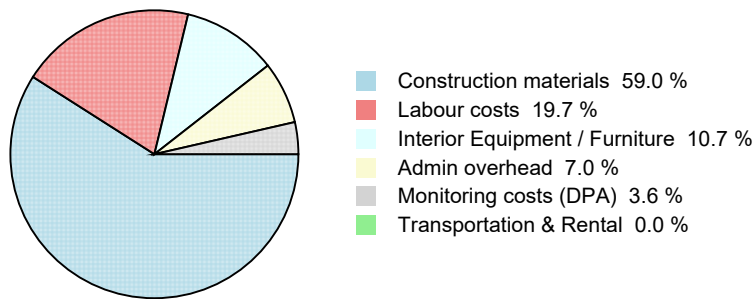

Budget vs Actual Cost

